

1.ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ / Дүүргийн спорт цогцолборын барилга, 700 суудал  
Улаанбаатар, Налайх /

Эскиз зураг



Хэрэгж иж эхэлсэн он	Дуусах он		Төсөвт өртөг		Санхүүжилт	
	Анх төлөвлөсөн	2023 оны ТТХ	Анх төлөвлөсөн	2023 оны ТТХ	2023 оны ТТХ	Авсан санхүүжилт 2023 он
2013	2013	2023	13.497 67	15,025,7	1,528,0	1.300.0
Захиалагч:			БТСУХ			
Гүйцэтгэгч:			"Бүрд констракшн" ХХК			
Зохиогч:			"Циркул проект" ХХК			
Гэрээний дүн, сая төгрөг			Анхны	15,025,700,000.00		
			Сүүлийн	15,025,700,000.00		
Эхлэх хугацаа:			2013-12-19			
Дуусах хугацаа:			2022-12-31			
Нийт санхүүжилт			14,238,7			

Одоогийн байдал /2024.01.10/




Үе шатны ажлуудын явц, хувь

Газар шороо	100
Суурь	100
Төмөр бетон карказ	100
Хана, хамар ханын өрлөг	100
Шал	100
Хаалга, цонх	100
Дээвэр	100
Дотор засал	100
Гадна засал	100
Халаалт	100
Салхивч	100
Цэвэр, бохир ус	100
Дулааны узель	100
Холбоо дохиолол	70
Дотор гэрэлтүүлэг	100
Хүчит төхөөрөмж	100
Гадна тохижилт	100
Гадна дулаан	100
Гадна ариутгах татуурга	100
Гадна ус хангамж	100
Гадна цахилгаан	100
Гадна холбоо	100
<b>БУА-ын гүйцэтгэл /дундаж/</b>	<b>95 %</b>

Бусад мэдээлэл, тайлбар /онцлох мэдээлэл оруулна/

Тэнхлэгээрээ 67.7 м x 51 м хэмжээтэй, зоорьтой, 3 давхар, 36 м x 30 м хэмжээтэй спорт заал, 25 м x 11 м хэмжээтэй сэлэлтийн 4 замтай усан бассейний барилга байна.

Явцын зураг /2024.01.10/ /дотор/

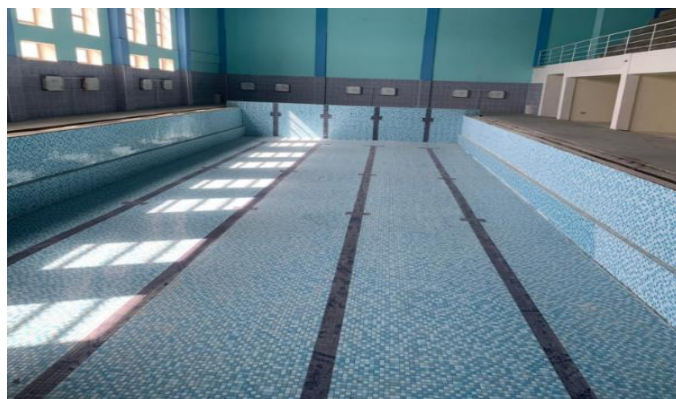

2.ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ /Хүүхэд, залуучуудын соёл, үйлчилгээний цогцолбор, усан бассейн байгуулах /Архангай, Эрдэнэбулган сум/

Эскиз зураг



Хэрэгжиж эхэлсэн он	Дуусах он		Төсөвт өртөг		Санхүүжилт	
	Анх төлөвлөсөн	2023 оны ТТХ	Анх төлөвлөсөн	2023 оны ТТХ	2023 оны ТТХ	Авсан санхүүжилт 2023 он
2020						
	2022	2025	1,470,0	2,450,3	46,2	46,2
Захиалагч:			БТСУХ			
Гүйцэтгэгч:			"Эбо сервис" ХХК			
Зохиогч:			"Мөнх инж констракшн" ХХК			
Гэрээний дүн, сая төгрөг			Анхны		1,470,0	
			Сүүлийн		2,450,60	
Эхлэх хугацаа:			2013.12.19			
Дуусах хугацаа:			2023.12.25			
Нийт санхүүжилт			2,450,3			


Одоогийн байдал /2024.01.10/

Үе шатны ажлуудын явц, хувь

Газар шороо	100
Суурь	100
Төмөр бетон карказ	100
Хана, хамар ханын өрлөг	100
Шал	100
Хаалга, цонх	80
Дээвэр	100
Дотор засал	30
Гадна засал	90
Халаалт	100
Салхивч	90
Цэвэр, бохир ус	100
Дулааны узель	100
Холбоо дохиолол	80
Дотор гэрэлтүүлэг	100
Хүчит төхөөрөмж	90
Гадна тохижилт	90
Гадна дулаан	100
Гадна ариутгах татуурга	100
Гадна ус хангамж	100
Гадна цахилгаан	100
Гадна холбоо	100
<b>БУА-ын гүйцэтгэл /дундаж/</b>	<b>80</b>

Бусад мэдээлэл, тайлбар /онцлох мэдээлэл оруулна/

Явцын зураг /2024.01.10/ /дотор/ Хүүхэд, залуучуудын соёл, үйлчилгээний цогцолбор, усан бассейн бүхий цогцолбор

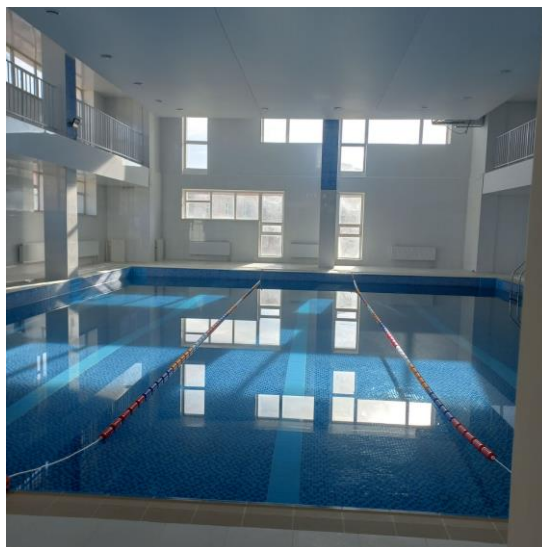

3. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ /Дүүргийн спорт цогцолбор, 700 суудал /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг//

Эскиз зураг

Хэрэгжиж эхэлсэн он	Дуусах он		Төсөвт өртөг		Санхүүжилт	
	Анх төлөвлөсөн	2023 оны ТТХ	Анх төлөвлөсөн	2023 оны ТТХ	2023 оны ТТХ	Авсан санхүүжилт 2023 он
2020	2014	2023	2,200,0	9,206,9	401,5	401,5
<b>Захиалагч:</b>			БТСУХ			
<b>Гүйцэтгэгч:</b>			"Молор Констракшн" ХХК			
<b>Зохиогч:</b>			"Зураг төсвийн хүрээлэн" ХХК			
<b>Гэрээний дүн, сая төгрөг</b>			Анхны		10,000.00	
			Сүүлийн		9,206.9	
<b>Эхлэх хугацаа:</b>			2013.06.25			
<b>Дуусах хугацаа:</b>			2023.12.25			
<b>Нийт санхүүжилт</b>			9,206,9			




Үе шатны ажлуудын явц, хувь

Газар шороо	100
Суурь	100
Төмөр бетон карказ	100
Хана, хамар ханын өрлөг	100
Шал	100
Хаалга, цонх	100
Дээвэр	100
Дотор засал	100
Гадна засал	100
Халаалт	100
Салхивч	100
Цэвэр, бохир ус	100
Дулааны узель	100
Холбоо дохиолол	100
Дотор гэрэлтүүлэг	100
Хүчит төхөөрөмж	100
Гадна тохижилт	100
Гадна дулаан	100
Гадна ариутгах татуурга	100
Гадна ус хангамж	100
Гадна цахилгаан	100
Гадна холбоо	100
<b>БУА-ын гүйцэтгэл /дундаж/</b>	<b>100</b>

Бусад мэдээлэл, тайлбар /онцлох мэдээлэл оруулна/

Тэнхэлгээрээ 56.6м х42.7м хэмжээтэй, зоорийн давхар бүхий 4 давхар цутгамал төмөр бетон араг бүтээцтэй

Явцын зураг /2024.01.10/ /дотор/

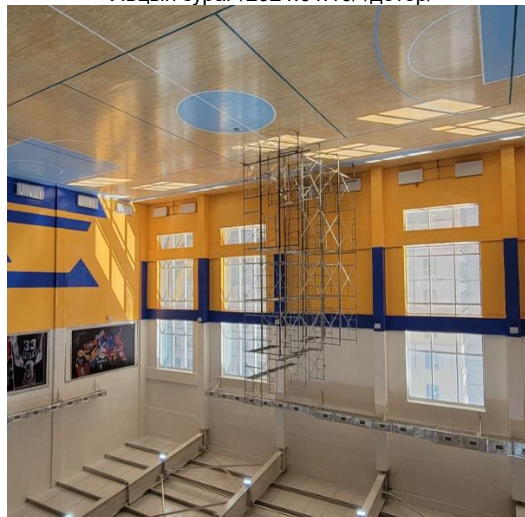



4.ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ / Оюуны спортын ордны барилга /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/

Эскиз зураг



ХУД, 10 ДУГААР ХОРОО ОЮУН УХААНЫ СПОРТЫН ОРДОН

Хэрэгжиж эхэлсэн он	Дуусах он		Төсөвт өртөг		Санхүүжилт	
	Анх төлөвлөсөн	2023 оны ТТХ	Анх төлөвлөсөн	2023 оны ТТХ	2023 оны ТТХ	Авсан санхүүжилт 2023 он
2019	2019	2023	4,000.0	4,297,5	297.5	260.19
Захиалагч:			БТСУХ			
Гүйцэтгэгч:			"Бианконеро" ХХК			
Зохиогч:			"Лэнд бимон констракшн" ХХК			
Гэрээний дүн, сая төгрөг			Анхны		4,000.0	
			Сүүлийн		4,000.0	
Эхлэх хугацаа:			2019-10-17			
Дуусах хугацаа:			2023-06-01			
Нийт санхүүжилт			3,500.00			

Одоогийн байдал /2024.01.10/

Үе шатны ажлуудын явц, хувь

Газар шороо	100
Суурь	100
Төмөр бетон карказ	100
Хана, хамар ханын өрлөг	100
Шал	50
Хаалга, цонх	100
Дээвэр	100
Дотор засал	100
Гадна засал	100
Халаалт	100
Салхивч	100
Цэвэр, бохир ус	100
Дулааны узель	50
Холбоо дохиолол	100
Дотор гэрэлтүүлэг	100
Хүчит төхөөрөмж	100
Гадна тохижилт	100
Гадна дулаан	50
Гадна ариутгах татуурга	100
Гадна ус хангамж	100
Гадна цахилгаан	100
Гадна холбоо	100
<b>БУА-ын гүйцэтгэл /дундаж/</b>	<b>95 %</b>

Бусад мэдээлэл, тайлбар /онцлох мэдээлэл оруулна/

Тэнхлэгээрээ 44.0м х 24.0м хэмжээтэй, зоорьгүй 2 давхар барилга байна.

Явцын зураг /2024.01.10/ /дотор/



ХУД, 10 ДУГААР ХОРОО ОЮУН УХААНЫ СПОРТЫН ОРДОН

5.ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ / Говь-Алтай аймаг, Бигэр сум, Спорт заалны барилга /

Эскиз зураг

Хэрэгжиж эхэлсэн он	Дуусах он		Төсөвт өртөг		Санхүүжилт	
	Анх төлөвлөсөн	2023 оны ТТХ	Анх төлөвлөсөн	2023 оны ТТХ	2023 оны ТТХ	Авсан санхүүжилт 2023 он
2022						
	2022	2025	616.7	705.3	88.6	63.3
Захиалагч:			БТСУХ			
Гүйцэтгэгч:			"Залуур өргөө" ХХК			
Зохиогч:			"Барилга байгууламж" ХХК			
Гэрээний дүн, сая төгрөг			Анхны	705,300		
			Сүүлийн	705,300		
Эхлэх хугацаа:			3/25/2022			
Дуусах хугацаа:			12/10/2023			
Нийт санхүүжилт			490,6			

Одоогийн байдал /2024.01.10/



Үе шатны ажлуудын явц, хувь	
Газар шороо	100
Суурь	100
Төмөр бетон карказ	100
Хана, хамар ханын өрлөг	72
Шал	11
Хаалга, цонх	80
Дээвэр	84
Дотор засал	30
Гадна засал	90
Халаалт	100
Салхивч	90
Цэвэр, бохир ус	0
Дулааны уzelь	100
Холбоо дохиолол	80
Дотор гэрэлтүүлэг	100
Хүчит төхөөрөмж	90
Гадна тохижилт	0
Гадна дулаан	0
Гадна ариутгах татуурга	100
Гадна ус хангамж	0
Гадна цахилгаан	0
Гадна холбоо	0
<b>БУА-ын гүйцэтгэл /дундаж/</b>	<b>60 %</b>

Бусад мэдээлэл, тайлбар /онцлох мэдээлэл оруулна/

Барилгын нийт талбай 30\*15м хэмжээтэй, 10\*6м хүзүүвтэй. 510м2 байна.

Явцын зураг /2024.01.10/ /дотор/



Эскиз зураг

Хэрэгжиж эхэлсэн он	Дуусах он		Төсөвт өртөг		Санхүүжилт	
	Анх төлөвлөсөн	2023 оны ТТХ	Анх төлөвлөсөн	2023 оны ТТХ	2023 оны ТТХ	Авсан санхүүжилт 2023 он
2019						
	2019	2023	700.4	876.0	175,6	133,61
Захиалагч:			БТСУХ			
Гүйцэтгэгч:			<a href="#">"Мөнх тооройт" ХХК</a>			
Зохиогч:			<a href="#">"Сивил дизайн" ХХК</a>			
Гэрээний дүн, сая төгрөг			Анхны	876,000,000.00		
			Сүүлийн	876,000,000.00		
Эхлэх хугацаа:			2019-10-09			
Дуусах хугацаа:			2022-11-28			
Нийт санхүүжилт			<b>914.9</b>			

Одоогийн байдал /2024.01.10/



Үе шатны ажлуудын явц, хувь

Газар шороо	100
Суурь	100
Төмөр бетон карказ	100
Хана, хамар ханын өрлөг	100
Шал	50
Хаалга, цонх	80
Дээвэр	100
Дотор засал	80
Гадна засал	100
Халаалт	100
Салхивч	100
Цэвэр, бохир ус	50
Дулааны уzelь	100
Холбоо дохиолол	100
Дотор гэрэлтүүлэг	10
Хүчит төхөөрөмж	100
Гадна тохижилт	0
Гадна дулаан	100
Гадна ариутгах татуурга	50
Гадна ус хангамж	100
Гадна цахилгаан	100
Гадна холбоо	100
<b>БУА-ын гүйцэтгэл /дундаж/</b>	<b>89 %</b>

Бусад мэдээлэл, тайлбар /онцлох мэдээлэл оруулна/

36x15 хэмжээтэй спорт заалны барилга байна.

Явцын зураг /2024.01.10/ /дотор/



Эскиз зураг



Одоогийн байдал /2024.01.10/

Хэрэгжиж эхэлсэн он	Дуусах он		Төсөвт өртөг		Санхүүжилт	
	Анх төлөвлөсөн	2023 оны ТТХ	Анх төлөвлөсөн	2023 оны ТТХ	2023 оны ТТХ	Авсан санхүүжилт 2023 он
2019	2019	2023	1,200.0	1,799.61	599,1	503,349,133

Захиалагч:	БТСУХ	
Гүйцэтгэгч:	<a href="#">"Мурал" ХХК</a>	
Зохиогч:	<a href="#">"АЕСН" ХХК</a>	
Гэрээний дүн, сая төгрөг	Анхны	1,613,974,842.00
	Сүүлийн	1,613,974,842.00
Эхлэх хугацаа:	2019-12-17	
Дуусах хугацаа:	2023-12-25	
Нийт санхүүжилт	<b>1,703,37</b>	



Үе шатны ажлуудын явц, хувь

Газар шороо	100
Суурь	100
Төмөр бетон карказ	100
Хана, хамар ханын өрлөг	100
Шал	50
Хаалга, цонх	100
Дээвэр	100
Дотор засал	100
Гадна засал	100
Халаалт	100
Салхивч	100
Цэвэр, бохир ус	100
Дулааны узель	50
Холбоо дохиолол	100
Дотор гэрэлтүүлэг	100
Хүчит төхөөрөмж	100
Гадна тохижилт	100
Гадна дулаан	50
Гадна ариутгах татуурга	100
Гадна ус хангамж	100
Гадна цахилгаан	100
Гадна холбоо	100
<b>БУА-ын гүйцэтгэл /дундаж/</b>	<b>95 %</b>

Бусад мэдээлэл, тайлбар /онцлох мэдээлэл оруулна/

Тэнхлэгээрээ 44.0м х 24.0м хэмжээтэй, зoorьгүй 2 давхар барилга байна.

Явцын зураг /2024.01.10/ /дотор/






Эскиз зураг

Одоогийн байдал /2024.01.10/

Хэрэгжиж эхэлсэн он	Дуусах он		Төсөвт өртөг		Санхүүжилт	
	Анх төлөвлөсөн	2023 оны ТТХ	Анх төлөвлөсөн	2023 оны ТТХ	2023 оны ТТХ	Авсан санхүүжилт 2023 он
2022						
	2022	2023	573.5	952,09	98,4	98.4
Захиалагч:			БТСУХ			
Гүйцэтгэгч:			<a href="#">"Аксу-Алтай" ХХК</a>			
Зохиогч:			<a href="#">Нью товер ХХК</a>			
Гэрээний дүн, сая төгрөг			Анхны	952,091,765		
			Сүүлийн	937,449,088		
Эхлэх хугацаа:			2022-04-26			
Дуусах хугацаа:			2024.06.31			
Нийт санхүүжилт			952.9			

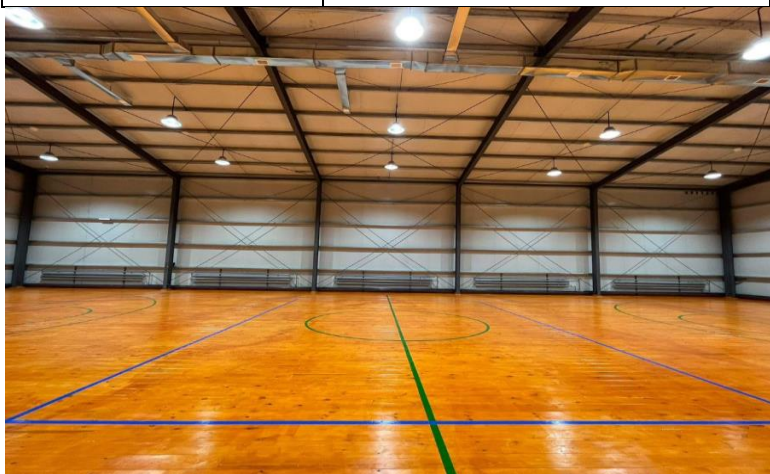


Үе шатны ажлуудын явц, хувь	
Газар шороо	100
Суурь	100
Төмөр бетон карказ	100
Хана, хамар ханын өрлөг	100
Шал	100
Хаалга, цонх	100
Дээвэр	100
Дотор засал	100
Гадна засал	100
Халаалт	100
Салхивч	100
Цэвэр, бохир ус	100
Дулааны уzelь	100
Холбоо дохиолол	100
Дотор гэрэлтүүлэг	100
Хүчит төхөөрөмж	100
Гадна тохижилт	100
Гадна дулаан	100
Гадна ариутгах татуурга	100
Гадна ус хангамж	100
Гадна цахилгаан	100
Гадна холбоо	100
<b>БУА-ын гүйцэтгэл /дундаж/</b>	<b>100</b>

Бусад мэдээлэл, тайлбар /онцлох мэдээлэл оруулна/

2023-12-01-ний өдрийн ГАА-КД-29/2023 дугаартай комиссын дүгнэлтээр ашиглалтад оруулсан болно.

Явцын зураг

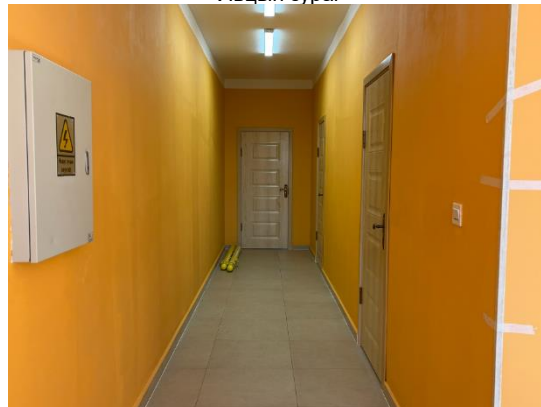

/2024.01.10/ /дотор/





Эскиз зураг

Одоогийн байдал /2024.01.10/

Хэрэгжиж эхэлсэн он	Дуусах он		Төсөвт өртөг		Санхүүжилт	
	Анх төлөвлөсөн	2023 оны ТТХ	Анх төлөвлөсөн	2023 оны ТТХ	2023 оны ТТХ	Авсан санхүүжилт 2023 он
2019	2023	2025	9.793 .4	11.071 .9	1,278,5	1,278,3
Захиалагч:			БТСУХ			
Гүйцэтгэгч:			<a href="#">"Суут Гэрт" ХХК</a>			
Зохиогч:			<a href="#">"ББСМО" ХХК</a>			
Гэрээний дүн, сая төгрөг			Анхны		10,892,661,309.00	
			Сүүлийн		10,892,661,309.00	
Эхлэх хугацаа:			2019-08-28			
Дуусах хугацаа:			2024-10-01			
Нийт санхүүжилт			<b>9,254,860,295.00</b>			



(XIX.1.13)

Үе шатны ажлуудын явц, хувь	
Газар шороо	
Суурь	100
Төмөр бетон карказ	100
Хана, хамар ханын өрлөг	90
Шал	50
Хаалга, цонх	100
Дээвэр	100
Дотор засал	30
Гадна засал	100
Халаалт	20
Салхивч	40
Цэвэр, бохир ус	50
Дулааны уzelь	50
Холбоо дохиолол	50
Дотор гэрэлтүүлэг	20
Хүчит төхөөрөмж	20
Гадна тохижилт	50
Гадна дулаан	100
Гадна ариутгах татуурга	100
Гадна ус хангамж	100
Гадна цахилгаан	100
Гадна холбоо	100
<b>БУА-ын гүйцэтгэл /дундаж/</b>	<b>85%</b>

Бусад мэдээлэл, тайлбар /онцлох мэдээлэл оруулна/

Соёл спорт цогцолборын барилга А блок тэнхлэгээрээ 21.0м х17.5м хэмжээтэй, 1 давхар төмөр бетон арагт бүтээцтэй, Б блок тэнхлэгээрээ 39.0м х 30.0м 3 давхар төмөр бетон арагт бүтээцтэй, В блок тэнхлэгээрээ 14.0м х 36.5м 1 давхар төмөр бетон арагт бүтээцтэй, Г блок тэнхлэгээрээ 56.0м х 21.0м 2 давхар төмөр бетон арагт бүтээцтэй, зөв бус хэлбэртэй барилга байна.

Явцын зураг /2024.01.10/ /дотор/



Эскиз зураг

Хэрэгжиж эхэлсэн он	Дуусах он		Төсөвт өртөг		Санхүүжилт	
	Анх төлөвлөсөн	2023 оны ТТХ	Анх төлөвлөсөн	2023 оны ТТХ	2023 оны ТТХ	Авсан санхүүжилт 2023 он
2021						
	2021	2023	550.0	881.0	331,0	330,97
Захиалагч:			БТСУХ			
Гүйцэтгэгч:			<a href="#">"Буюн аривжих од" ХХК</a>			
Зохиогч:			<a href="#">"Цэсда" ХХК</a>			
Гэрээний дүн, сая төгрөг			Анхны	872,380,106.00		
			Сүүлийн	872,380,106.00		
Эхлэх хугацаа:			2021-08-13			
Дуусах хугацаа:			2023-11-10			
Нийт санхүүжилт			<b>830,97</b>			

Одоогийн байдал /2024.01.10/




Үе шатны ажлуудын явц, хувь	
Газар шороо	100
Суурь	100
Төмөр бетон карказ	100
Хана, хамар ханын өрлөг	100
Шал	100
Хаалга, цонх	100
Дээвэр	100
Дотор засал	100
Гадна засал	100
Халаалт	100
Салхивч	100
Цэвэр, бохир ус	100
Дулааны уzelь	100
Холбоо дохиолол	100
Дотор гэрэлтүүлэг	100
Хүчит төхөөрөмж	100
Гадна тохижилт	100
Гадна дулаан	100
Гадна ариутгах татуурга	100
Гадна ус хангамж	100
Гадна цахилгаан	100
Гадна холбоо	100
<b>БУА-ын гүйцэтгэл /дундаж/</b>	<b>100 %</b>

Бусад мэдээлэл, тайлбар /онцлох мэдээлэл оруулна/

Тэнхлэгээрээ 30.0мx15.0м хэмжээтэй барилга байна.

Явцы

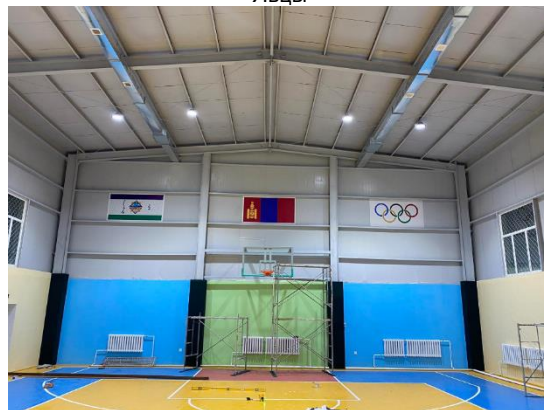

н зураг /2024.01.10/ /дотор/



(XIX.1.15)

XIX.1.16

11.ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ / Цэнгэлдэх хүрээлэнгийн барилга Говь Алтай, Есөнбулаг сум /

Эскиз зураг

Хэрэгжиж эхэлсэн он	Дуусах он		Төсөвт өртөг		Санхүүжилт	
	Анх төлөвлөсөн	2023 оны ТТХ	Анх төлөвлөсөн	2023 оны ТТХ	2023 оны ТТХ	Авсан санхүүжилт 2023 он
2022	2022	2025	6.495.9	7,068,9	573,0	572,99
Захиалагч:			БТСУХ			
Гүйцэтгэгч:			<a href="#">"Арвин бэлт" ХХК</a>			
Зохиогч:			<a href="#">"Эл Эй Ай Ди Групп" ХХК</a>			
Гэрээний дүн, сая төгрөг			Анхны	7,068,920,369.00		
			Сүүлийн	7,068,920,369.00		
Эхлэх хугацаа:			2020-06-10			
Дуусах хугацаа:			2023-09-30			
Нийт санхүүжилт			<b>7,062,69</b>			

Одоогийн байдал /2024.01.10/



Үе шатны ажлуудын явц, хувь	
Газар шороо	100
Суурь	100
Төмөр бетон карказ	100
Хана, хамар ханын өрлөг	100
Шал	100
Хаалга, цонх	100
Дээвэр	100
Дотор засал	100
Гадна засал	100
Халаалт	100
Салхивч	100
Цэвэр, бохир ус	100
Дулааны уzelь	100
Холбоо дохиолол	100
Дотор гэрэлтүүлэг	100
Хүчит төхөөрөмж	100
Гадна тохижилт	100
Гадна дулаан	100
Гадна ариутгах татуурга	100
Гадна ус хангамж	100
Гадна цахилгаан	100
Гадна холбоо	100
<b>БУА-ын гүйцэтгэл /дундаж/</b>	<b>100 %</b>

Бусад мэдээлэл, тайлбар /онцлох мэдээлэл оруулна/

А блок тэнхлэгээрээ 34.0 м х 16.0 м хэмжээтэй, зорьгүй, 2 давхар, Б блок тэнхлэгээрээ 18.8 м х 11.8 м хэмжээтэй, зорьгүй, 2 давхар, нийтийн бие засах газар тэнхлэгээрээ 17.4 м х 7.43 м хэмжээтэй, зорьгүй, 1 давхар. Ус, дулаан дамжуулах төв тэнхлэгээрээ 10.8 м х 8.4 м хэмжээтэй, зорьгүй, 1 давхар. Задгай үзэгчдийн суудал тэнхлэгээрээ 167.2 м х 82.8 м хэмжээтэй, тойрог хэлбэрийн 6 хэсэгт хуваагдсан үзэгчдийн суудалтай байна.

Явцын зураг /2024.01.10/ /дотор/





Эскиз зураг



Хэрэгжиж эхэлсэн он	Дуусах он		Төсөвт өртөг		Санхүүжилт	
	Анх төлөвлөсөн	2023 оны ТТХ	Анх төлөвлөсөн	2023 оны ТТХ	2023 оны ТТХ	Авсан санхүүжилт 2023 он
2019	2019	2023	1.8000.0	2.065.7	279,1	279,1
<b>Захиалагч:</b>			БТСУХ			
<b>Гүйцэтгэгч:</b>			"Мандалт констракшн" ХХК			
<b>Зохиогч:</b>			"Дөрвөн гүн" ХХК			
<b>Гэрээний дүн, сая төгрөг</b>			Анхны	1,800.00		
			Сүүлийн	1,800.00		
<b>Эхлэх хугацаа:</b>			2015.06.05			
<b>Дуусах хугацаа:</b>			2023-12-01			
<b>Нийт санхүүжилт</b>			2.065.7			

Үе шатны ажлуудын явц, хувь	
Газар шороо	100
Суурь	100
Төмөр бетон карказ	100
Хана, хамар ханын өрлөг	100
Шал	100
Хаалга, цонх	100
Дээвэр	100
Дотор засал	100
Гадна засал	100
Халаалт	100
Салхивч	100
Цэвэр, бохир ус	100
Дулааны узель	100
Холбоо дохиолол	100
Дотор гэрэлтүүлэг	100
Хүчит төхөөрөмж	100
Гадна тохижилт	100
Гадна дулаан	100
Гадна ариутгах татуурга	100
Гадна ус хангамж	100
Гадна цахилгаан	100
Гадна холбоо	100
<b>БУА-ын гүйцэтгэл /дундаж/</b>	<b>100 %</b>

Бусад мэдээлэл, тайлбар /онцлох мэдээлэл оруулна/  
Ашиглалтанд орсон.

Явцын зураг /2024.01.10/ /дотор/

Эскиз зураг

Хэрэгжиж эхэлсэн он	Дуусах он		Төсөвт өртөг		Санхүүжилт	
	Анх төлөвлөсөн	2023 оны ТТХ	Анх төлөвлөсөн	2023 оны ТТХ	2023 оны ТТХ	Авсан санхүүжилт 2023 он
2022	2022	2025	1.3000.0	2.535.8	1,224.4000	1,224,400,000

Захиалагч:	БТСУХ	
Гүйцэтгэгч:	<a href="#">"Мана Оюу Увс" ХХК</a>	
Зохиогч:	<a href="#">"Болор төсөл" ХХК</a>	
Гэрээний дүн, сая төгрөг	Анхны	705,300
	Сүүлийн	705,300
Эхлэх хугацаа:	2021-10-12	
Дуусах хугацаа:	2023-12-01	
Нийт санхүүжилт	<b>2,492,6</b>	

Одоогийн байдал /2024.01.10/



XIX.1.21

Үе шатны ажлуудын явц, хувь	
Газар шороо	100
Суурь	100
Төмөр бетон карказ	100
Хана, хамар ханын өрлөг	100
Шал	100
Хаалга, цонх	100
Дээвэр	100
Дотор засал	100
Гадна засал	100
Халаалт	100
Салхивч	100
Цэвэр, бохир ус	100
Дулааны уэль	100
Холбоо дохиолол	100
Дотор гэрэлтүүлэг	100
Хүчит төхөөрөмж	100
Гадна тохижилт	100
Гадна дулаан	100
Гадна ариутгах татуурга	100
Гадна ус хангамж	100
Гадна цахилгаан	100
Гадна холбоо	100
<b>БУА-ын гүйцэтгэл /дундаж/</b>	<b>100 %</b>

Бусад мэдээлэл, тайлбар /онцлох мэдээлэл оруулна/  
Тэнхлэгээрээ 18.0 м х 40.0 м хэмжээтэй, зoorьгүй барилга байна.

Явцын зураг /2024.01.10/ /дотор/



Эскиз зураг



Хэрэгжиж эхэлсэн он	Дуусах он		Төсөвт өртөг		Санхүүжилт	
	Анх төлөвлөсөн	2023 оны ТТХ	Анх төлөвлөсөн	2023 оны ТТХ	2023 оны ТТХ	Авсан санхүүжилт 2023 он
2022	2022	2025	11.85 8.7	12.980 10	8,759,6	8,095,2
Захиалагч:			БТСУХ			
Гүйцэтгэгч:			<a href="#">"Эх бүрдэн" ХХК</a>			
Зохиогч:			<a href="#">"Ньюкон" ХХК</a>			
Гэрээний дүн, сая төгрөг			Анхны		705,300	
			Сүүлийн		705,300	
Эхлэх хугацаа:			2021-08-18			
Дуусах хугацаа:			2025-10-31			
Нийт санхүүжилт			<b>12,781,37</b>			



Үе шатны ажлуудын явц, хувь	
Газар шороо	100
Суурь	100
Төмөр бетон карказ	100
Хана, хамар ханын өрлөг	85
Шал	100
Хаалга, цонх	100
Дээвэр	100
Дотор засал	80
Гадна засал	100
Халаалт	100
Салхивч	100
Цэвэр, бохир ус	100
Дулааны узель	100
Холбоо дохиолол	70
Дотор гэрэлтүүлэг	100
Хүчит төхөөрөмж	100
Гадна тохижилт	80
Гадна дулаан	100
Гадна ариутгах татуурга	100
Гадна ус хангамж	70
Гадна цахилгаан	85
Гадна холбоо	80
<b>БУА-ын гүйцэтгэл /дундаж/</b>	<b>89.63%</b>

Бусад мэдээлэл, тайлбар /онцлох мэдээлэл оруулна/

Тэнхлэгээрээ 60.0 м х 63.0 м, зoorьгүй, 2 давхар 5,891.84 м.кв барилга байна.

Явцын зураг /2024.01.10/ /дотор/





Эскиз зураг

Хэрэгжиж эхэлсэн он	Дуусах он		Төсөвт өртөг		Санхүүжилт	
	Анх төлөвлөсөн	2023 оны ТТХ	Анх төлөвлөсөн	2023 оны ТТХ	2023 оны ТТХ	Авсан санхүүжилт 2023 он
2021	2021	2023	7.900 .0	10.312 .5	7,112,5 00,000	4,911,8 20,000
Захиалагч:			БТСУХ			
Гүйцэтгэгч:			<a href="#">"Биг Монголиа Билдинг" ХХК</a>			
Зохиогч:			<a href="#">"Криетив монголиа" ХХК</a>			
Гэрээний дүн, сая төгрөг			Анхны		10,208,911,100	
			Сүүлийн		10,208,911,100	
Эхлэх хугацаа:			2021-07-09			
Дуусах хугацаа:			2023-12-31			
Нийт санхүүжилт			<b>8,063,21</b>			

Одоогийн байдал /2024.01.10/



Үе шатны ажлуудын явц, хувь	
Газар шороо	100
Суурь	100
Төмөр бетон карказ	100
Хана, хамар ханын өрлөг	40
Шал	40
Хаалга, цонх	10
Дээвэр	100
Дотор засал	10
Гадна засал	60
Халаалт	10
Салхивч	10
Цэвэр, бохир ус	100
Дулааны уzelь	100
Холбоо дохиолол	40
Дотор гэрэлтүүлэг	40
Хүчит төхөөрөмж	100
Гадна тохижилт	0
Гадна дулаан	100
Гадна ариутгах татуурга	100
Гадна ус хангамж	100
Гадна цахилгаан	100
Гадна холбоо	100
<b>БУА-ын гүйцэтгэл /дундаж/</b>	<b>60 %</b>

Бусад мэдээлэл, тайлбар /онцлох мэдээлэл оруулна/  
Тэнхлэгээрээ 30.0м х 30.0м хэмжээтэй, зоорьтой, 2 давхар барилга байна.

Явцын зураг /2024.01.10/ /дотор/



Эскиз зураг



Хэрэгжиж эхэлсэн он	Дуусах он		Төсөвт өртөг		Санхүүжилт	
	Анх төлөвлөсөн	2023 оны ТТХ	Анх төлөвлөсөн	2023 оны ТТХ	2023 оны ТТХ	Авсан санхүүжилт 2023 он
2021	2021	2023	1,394.7	1,394,7	210,1	94,4
Захиалагч:			БТСУХ			
Гүйцэтгэгч:			<a href="#">"Мана Оюу Увс" ХХК</a>			
Зохиогч:			<a href="#">"Болор төсөл" ХХК</a>			
Гэрээний дүн, сая төгрөг			Анхны		1,371,792,439	
			Сүүлийн		1,371,792,439	
Эхлэх хугацаа:			2021-09-21			
Дуусах хугацаа:			2023-12-10			
Нийт санхүүжилт			1,032.3			



Үе шатны ажлуудын явц, хувь	
Газар шороо	100
Суурь	100
Төмөр бетон карказ	100
Хана, хамар ханын өрлөг	100
Шал	10
Хаалга, цонх	10
Дээвэр	90
Дотор засал	10
Гадна засал	40
Халаалт	40
Салхивч	40
Цэвэр, бохир ус	80
Дулааны уэль	80
Холбоо дохиолол	100
Дотор гэрэлтүүлэг	40
Хүчит төхөөрөмж	100
Гадна тохижилт	100
Гадна дулаан	100
Гадна ариутгах татуурга	100
Гадна ус хангамж	100
Гадна цахилгаан	100
Гадна холбоо	100
<b>БУА-ын гүйцэтгэл /дундаж/</b>	<b>69%</b>

Бусад мэдээлэл, тайлбар /онцлох мэдээлэл оруулна/

Тэнхлэгээрээ 34.0 м х 18.0 м хэмжээтэй, зоорьгүй барилга байна.

Явцын зураг /2024.01.10/ /дотор/



Эскиз зураг

Одоогийн байдал /2024.01.10/

Хэрэгжиж эхэлсэн он	Дуусах он		Төсөвт өртөг		Санхүүжилт	
	Анх төлөвлөсөн	2023 оны ТТХ	Анх төлөвлөсөн	2023 оны ТТХ	2023 оны ТТХ	Авсан санхүүжилт 2023 он
2021	2021	2023	5,000.0	8,576.9	2,000,0	2,000,0

Захиалагч:	БТСУХ	
Гүйцэтгэгч:	"Аглут" ХХК	
Зохиогч:	"Дөрвөн гүн" ХХК	
Гэрээний дүн, сая төгрөг	Анхны	5,000.0
	Сүүлийн	5,000.0
Эхлэх хугацаа:	2021.09.26	
Дуусах хугацаа:	2022.10.31	
Нийт санхүүжилт	5.254.5	

Үе шатны ажлуудын явц, хувь

Газар шороо	100
Суурь	100
Төмөр бетон карказ	80
Хана, хамар ханын өрлөг	0
Шал	0
Хаалга, цонх	0
Дээвэр	0
Дотор засал	0
Гадна засал	0
Халаалт	0
Салхивч	0
Цэвэр, бохир ус	0
Дулааны уzelь	0
Холбоо дохиолол	0
Дотор гэрэлтүүлэг	0
Хүчит төхөөрөмж	0
Гадна тохижилт	0
Гадна дулаан	0
Гадна ариутгах татуурга	0
Гадна ус хангамж	0
Гадна цахилгаан	0
Гадна холбоо	0
<b>БУА-ын гүйцэтгэл /дундаж/</b>	<b>40 %</b>

Бусад мэдээлэл, тайлбар /онцлох мэдээлэл оруулна/  
Тэнхлэгээрээ 44.0м х 24.0м хэмжээтэй, зоорьгүй 2 давхар барилга байна.

Явцын зураг /2024.01.10/ /дотор/



Эскиз зураг

Хэрэгжиж эхэлсэн он	Дуусах он		Төсөвт өртөг		Санхүүжилт	
	Анх төлөвлөсөн	2023 оны ТТХ	Анх төлөвлөсөн	2023 оны ТТХ	2023 оны ТТХ	Авсан санхүүжилт 2023 он
2021	2021	2023	2.000.0	3,425,	1,425,0	1,424,5
Захиалагч:			БТСУХ			
Гүйцэтгэгч:			<a href="#">Баруун жонон ххк</a>			
Зохиогч:			<a href="#">"Жаргалант хийц" ХХК</a>			
Гэрээний дүн, сая төгрөг			Анхны		705,300	
			Сүүлийн		705,300	
Эхлэх хугацаа:			2021-11-18			
Дуусах хугацаа:			2023-11-10			
Нийт санхүүжилт			<b>3,424,55</b>			

Одоогийн байдал /2024.01.10/



Үе шатны ажлуудын явц, хувь	
Газар шороо	100
Суурь	100
Төмөр бетон карказ	100
Хана, хамар ханын өрлөг	100
Шал	100
Хаалга, цонх	100
Дээвэр	100
Дотор засал	100
Гадна засал	100
Халаалт	100
Салхивч	100
Цэвэр, бохир ус	100
Дулааны узель	100
Холбоо дохиолол	100
Дотор гэрэлтүүлэг	100
Хүчит төхөөрөмж	100
Гадна тохижилт	100
Гадна дулаан	100
Гадна ариутгах татуурга	100
Гадна ус хангамж	100
Гадна цахилгаан	100
Гадна холбоо	100
<b>БУА-ын гүйцэтгэл /дундаж/</b>	<b>100 %</b>

Бусад мэдээлэл, тайлбар /онцлох мэдээлэл оруулна/

Барилга нь тэнхлэгээрээ 48.0 м х 24.0 м хэмжээтэй, Давхрын тоо: 0.00 түвшнээс доош зорьгүй, 0.00 түвшнээс дээш 2 давхар, барилгын хэмжээ S=26304 м2

Явцын зураг /2024.01.10/ /дотор/



Эскиз зураг



Хэрэгжиж эхэлсэн он	Дуусах он		Төсөвт өртөг		Санхүүжилт	
	Анх төлөвлөсөн	2023 оны ТТХ	Анх төлөвлөсөн	2023 оны ТТХ	2023 оны ТТХ	Авсан санхүүжилт 2023 он
2019	2019	2023	3.50 0.0	4.760. 7	869,10	869,10
<b>Захиалагч:</b>			БТСУХ			
<b>Гүйцэтгэгч:</b>			"Хөшиг Уул" ХХК			
<b>Зохиогч:</b>			"Автокад" ХХК			
<b>Гэрээний дүн, сая төгрөг</b>			Анхны		3,766.77	
			Сүүлийн		3,766.77	
<b>Эхлэх хугацаа:</b>			2015.06.05			
<b>Дуусах хугацаа:</b>			2023-06-01			
<b>Нийт санхүүжилт</b>			4,760,7			

Үе шатны ажлуудын явц, хувь

Газар шороо	100
Суурь	100
Төмөр бетон карказ	80
Хана, хамар ханын өрлөг	0
Шал	0
Хаалга, цонх	0
Дээвэр	0
Дотор засал	0
Гадна засал	0
Халаалт	0
Салхивч	0
Цэвэр, бохир ус	0
Дулааны уэль	0
Холбоо дохиолол	0
Дотор гэрэлтүүлэг	0
Хүчит төхөөрөмж	0
Гадна тохижилт	0
Гадна дулаан	0
Гадна ариутгах татуурга	0
Гадна ус хангамж	0
Гадна цахилгаан	0
Гадна холбоо	0
<b>БУА-ын гүйцэтгэл /дундаж/</b>	<b>40 %</b>

Бусад мэдээлэл, тайлбар /онцлох мэдээлэл оруулна/

Тэнхлэгээрээ 44.0м х 24.0м хэмжээтэй, зoorьгүй 2 давхар барилга байна.

Явцын зураг /2024.01.10/ /дотор/



20.ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ / Спорты заалны барилга Хэнтий аймаг Хэрлэн сум/

Эскиз зураг



Үе шатны ажлуудын явц, хувь

Газар шороо	100
Суурь	100
Төмөр бетон карказ	100
Хана, хамар ханын өрлөг	100
Шал	100
Хаалга, цонх	100
Дээвэр	100
Дотор засал	100
Гадна засал	100
Халаалт	100
Салхивч	100
Цэвэр, бохир ус	100
Дулааны узель	100
Холбоо дохиолол	100
Дотор гэрэлтүүлэг	100
Хүчит төхөөрөмж	100
Гадна тохижилт	100
Гадна дулаан	100
Гадна ариутгах татуурга	100
Гадна ус хангамж	100
Гадна цахилгаан	100
Гадна холбоо	100
<b>БУА-ын гүйцэтгэл /дундаж/</b>	<b>100 %</b>

Хэрэгжиж эхэлсэн он	Дуусах он		Төсөвт өртөг		Санхүүжилт	
	Анх төлөвлөсөн	2023 оны ТТХ	Анх төлөвлөсөн	2023 оны ТТХ	2023 оны ТТХ	Авсан санхүүжилт 2023 он
2019	2019	2023	750.0	1.188.20	235,5	234,6

Захиалагч:	БТСУХ	
Гүйцэтгэгч:	"Бүст-Улаан" ХХК	
Зохиогч:	"Анга транс" ХХК	
Гэрээний дүн, сая төгрөг	Анхны	963.20
	Сүүлийн	963.20
Эхлэх хугацаа:	2015.06.05	
Дуусах хугацаа:	2023-06-01	
Нийт санхүүжилт	1,188.20	

Бусад мэдээлэл, тайлбар /онцлох мэдээлэл оруулна/  
Тэнхлэгээрээ 44.0м х 24.0м хэмжээтэй, зоорьгүй 2 давхар барилга байна.

Явцын зураг /2024.01.10/ /дотор/

21.ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ / Төв аймаг Жаргалант сум спорт заалны барилга /

Эскиз зураг



Хэрэгжиж эхэлсэн он	Дуусах он		Төсөвт өртөг		Санхүүжилт	
	Анх төлөвлөсөн	2023 оны ТТХ	Анх төлөвлөсөн	2023 оны ТТХ	2023 оны ТТХ	Авсан санхүүжилт 2023 он
2022		2025	600.0	1,383,6	1,083,6	1,059,19
Захиалагч:			БТСУХ			
Гүйцэтгэгч:			<a href="#">"Сэрвэн овоот" ХХК</a>			
Зохиогч:			<a href="#">Татбос ХХК</a>			
Гэрээний дүн, сая төгрөг			Анхны		705,300	
			Сүүлийн		705,300	
Эхлэх хугацаа:			2022-02-08			
Дуусах хугацаа:			2024-06-01			
Нийт санхүүжилт			1,383,64			

Одоогийн байдал /2024.01.10/



Үе шатны ажлуудын явц, хувь

Газар шороо	100
Суурь	100
Төмөр бетон карказ	100
Хана, хамар ханын өрлөг	72
Шал	11
Хаалга, цонх	80
Дээвэр	84
Дотор засал	30
Гадна засал	90
Халаалт	100
Салхивч	90
Цэвэр, бохир ус	100
Дулааны уzelь	100
Холбоо дохиолол	80
Дотор гэрэлтүүлэг	100
Хүчит төхөөрөмж	90
Гадна тохижилт	90
Гадна дулаан	100
Гадна ариутгах татуурга	100
Гадна ус хангамж	100
Гадна цахилгаан	100
Гадна холбоо	100
<b>БУА-ын гүйцэтгэл /дундаж/</b>	<b>85 %</b>

Бусад мэдээлэл, тайлбар /онцлох мэдээлэл оруулна/

Барилгын нийт талбай 30\*15м хэмжээтэй, 10\*6м хүзүүвчтэй. 510м2 байна.

Явцын зураг /2024.01.10/ /дотор/





Эскиз зураг



Хэрэгжиж эхэлсэн он	Дуусах он		Төсөвт өртөг		Санхүүжилт	
	Анх төлөвлөсөн	2023 оны ТТХ	Анх төлөвлөсөн	2023 оны ТТХ	2023 оны ТТХ	Авсан санхүүжилт 2023 он
2022		2025	13.000.0	12,840,4	4,826,800	4,826,8
Захиалагч:			БТСУХ			
Гүйцэтгэгч:			<a href="#">"Жи Жи Ай" ХХК</a>			
Зохиогч:			<a href="#">"Зед прожект" ХХК</a>			
Гэрээний дүн, сая төгрөг			Анхны	705,300		
			Сүүлийн	705,300		
Эхлэх хугацаа:			2022-04-20			
Дуусах хугацаа:			2024-10-30			
Нийт санхүүжилт			6,426,800,000.00			



Үе шатны ажлуудын явц, хувь

Газар шороо	100
Суурь	100
Төмөр бетон карказ	30
Хана, хамар ханын өрлөг	0
Шал	0
Хаалга, цонх	80
Дээвэр	50
Дотор засал	0
Гадна засал	0
Халаалт	0
Салхивч	0
Цэвэр, бохир ус	0
Дулааны уzelь	0
Холбоо дохиолол	80
Дотор гэрэлтүүлэг	0
Хүчит төхөөрөмж	0
Гадна тохижилт	0
Гадна дулаан	100
Гадна ариутгах татуурга	100
Гадна ус хангамж	0
Гадна цахилгаан	100
Гадна холбоо	100
<b>БУА-ын гүйцэтгэл /дундаж/</b>	<b>50,05 %</b>

Бусад мэдээлэл, тайлбар /онцлох мэдээлэл оруулна/

64мх76.6м, 2 давхар, 1 давхар зоорьтой, 850 суудалтай барилга байна. Цутгалтын ажи

Явцын зураг /202.01.10/ /дотор/





Хэрэгжиж эхэлсэн он	Дуусах он		Төсөвт өртөг		Санхүүжилт	
	Анх төлөвлөсөн	2023 оны ТТХ	Анх төлөвлөсөн	2023 оны ТТХ	2023 оны ТТХ	Авсан санхүүжилт 2023 он
2022-02-15						
	2022	2024	1.330.0	2.412.9	815,6	815,6
<b>Захиалагч:</b>			БТСУХ			
<b>Гүйцэтгэгч:</b>			"Алтайшар Говь" ХХК			
<b>Зохиогч:</b>			"Халзан дуулга" ХХК			
<b>Гэрээний дүн, сая төгрөг</b>			Анхны		10,000.00	
			Сүүлийн		15,000.00	
<b>Эхлэх хугацаа:</b>			2/15/2022			
<b>Дуусах хугацаа:</b>			12/1/2024			
<b>Нийт санхүүжилт</b>			1.315.6			



Үе шатны ажлуудын явц, хувь	
Газар шороо	100
Суурь	100
Төмөр бетон карказ	100
Хана, хамар ханын өрлөг	100
Шал	100
Хаалга, цонх	80
Дээвэр	100
Дотор засал	30
Гадна засал	90
Халаалт	100
Салхивч	90
Цэвэр, бохир ус	100
Дулааны узель	100
Холбоо дохиолол	80
Дотор гэрэлтүүлэг	100
Хүчит төхөөрөмж	90
Гадна тохижилт	90
Гадна дулаан	100
Гадна ариутгах татуурга	100
Гадна ус хангамж	100
Гадна цахилгаан	100
Гадна холбоо	100
<b>БУА-ын гүйцэтгэл /дундаж/</b>	<b>60</b>

**Бусад мэдээлэл, тайлбар /онцлох мэдээлэл оруулна/**  
 Барилгын нийт талбай Тэнхлэгээрээ 30.0 м x 25.0 м, 2 давхар, 960.0 м.кв байна.

Явцын зураг /2024.01.10/ /дотор/






Эскиз зураг




Хэрэгжиж эхэлсэн он	Дуусах он		Төсөвт өртөг		Санхүүжилт	
	Анх төлөвлөсөн	2023 оны ТТХ	Анх төлөвлөсөн	2023 оны ТТХ	2023 оны ТТХ	Авсан санхүүжилт 2023 он
2020		2025	5,253,9	5,253,9	3,690,900	3,690,900
Захиалагч:			БТСУХ			
Гүйцэтгэгч:			<a href="#">"Их модун" ХХК</a>			
Зохиогч:			<a href="#">"Ти Энд Жи" ХХК</a>			
Гэрээний дүн, сая төгрөг			Анхны		10,000.00	
			Сүүлийн		15,000.00	
Эхлэх хугацаа:			2022-04-04			
Дуусах хугацаа:			2023-08-31			
Нийт санхүүжилт			5.253.9			

Одоогийн байдал /2024.02.20/

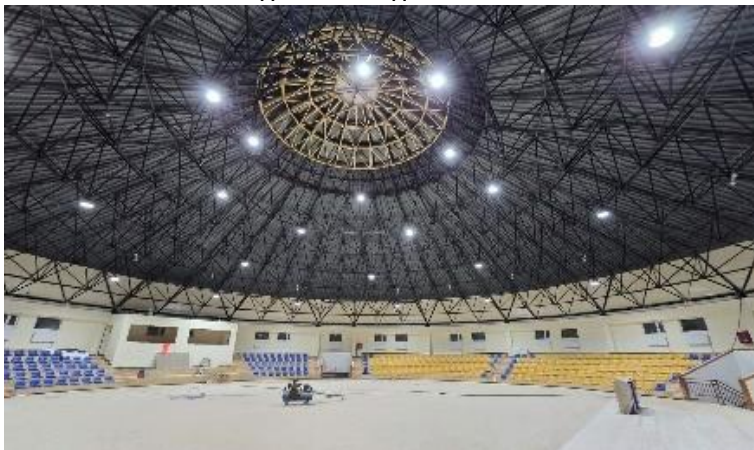

Явцын зураг

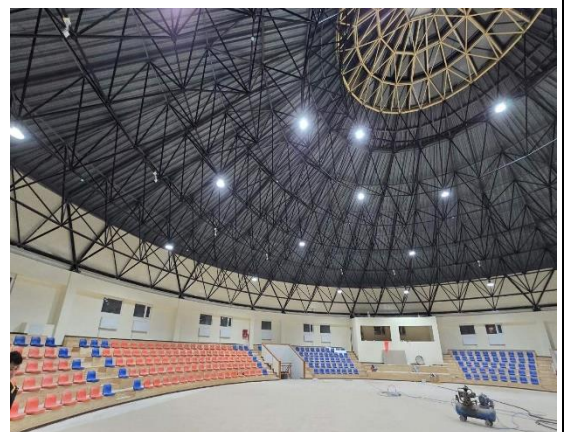

Үе шатны ажлуудын явц, хувь

Газар шороо	100
Суурь	100
Төмөр бетон карказ	80
Хана, хамар ханын өрлөг	100
Шал	100
Хаалга, цонх	100
Дээвэр	100
Дотор засал	100
Гадна засал	100
Халаалт	100
Салхивч	60
Цэвэр, бохир ус	100
Дулааны уэль	100
Холбоо дохиолол	100
Дотор гэрэлтүүлэг	100
Хүчит төхөөрөмж	100
Гадна тохижилт	100
Гадна дулаан	100
Гадна ариутгах татуурга	100
Гадна ус хангамж	100
Гадна цахилгаан	50
Гадна холбоо	100
<b>БУА-ын гүйцэтгэл /дундаж/</b>	<b>90</b>

Бусад мэдээлэл, тайлбар /онцлох мэдээлэл оруулна/

2292 м.кв дугуй хэлбэртэй, 2 давхар барилга байна. Буулгах ажил, гадна зам талбайн ажил, гадна цахилгаан, гадна дэд өртөөний ажил, үндсэн барилгын 2-р давхрын карказ угсралтын ажил, гадна ханын ажлыг батлагдсан зураг төсөв, барилгын норм дүрмийн дагуу гүйцэтгэсэн. Метал ферм угсралт хучилтын ажил гүйцэтгэж байна.

Эскиз зураг



Хэрэгжиж эхэлсэн он	Дуусах он		Төсөвт өртөг		Санхүүжилт	
	Анх төлөвлөсөн	2023 оны ТТХ	Анх төлөвлөсөн	2023 оны ТТХ	2023 оны ТТХ	Авсан санхүүжилт 2023 он
2022		2025	941,3	941,3	541.19	541.19
Захиалагч:			БТСУХ			
Гүйцэтгэгч:			<a href="#">Орхон-Од ХХК</a>			
Зохиогч:			<a href="#">"Автокад" ххк</a>			
Гэрээний дүн, сая төгрөг			Анхны	705,300		
			Сүүлийн	705,300		
Эхлэх хугацаа:			2022-04-28			
Дуусах хугацаа:			2023-08-01			
Нийт санхүүжилт			941,29			

Одоогийн байдал /2024.01.10/



Үе шатны ажлуудын явц, хувь

Газар шороо	100
Суурь	100
Төмөр бетон карказ	100
Хана, хамар ханын өрлөг	100
Шал	100
Хаалга, цонх	100
Дээвэр	100
Дотор засал	100
Гадна засал	100
Халаалт	100
Салхивч	100
Цэвэр, бохир ус	100
Дулааны уzelь	100
Холбоо дохиолол	100
Дотор гэрэлтүүлэг	100
Хүчит төхөөрөмж	100
Гадна тохижилт	100
Гадна дулаан	100
Гадна ариутгах татуурга	100
Гадна ус хангамж	100
Гадна цахилгаан	100
Гадна холбоо	100
<b>БУА-ын гүйцэтгэл /дундаж/</b>	<b>100%</b>

Бусад мэдээлэл, тайлбар /онцлох мэдээлэл оруулна/

Спорт заалны барилга угсралтын ажлыг норм дүрмийн дагуу хийж гүйцэтгэн 2023 оны 07 дугаар сарын 08-ны өдрийн 04/2023-Д дугаартай комиссын дүгнэлтээр ашиглалтад оруулсан.

Явцын зураг /2024.01.10/ /дотор/





Эскиз зураг

Хэрэгжиж эхэлсэн он	Дуусах он		Төсөвт өртөг		Санхүүжилт	
	Анх төлөвлөсөн	2023 оны ТТХ	Анх төлөвлөсөн	2023 оны ТТХ	2023 оны ТТХ	Авсан санхүүжилт 2023 он
2021	2021	2024	1.500.0	4.420.2	1,128.5	1,128.5
Захиалагч:			БТСУХ			
Гүйцэтгэгч:			<a href="#">"Ашид гэгээн өргөө" ХХК</a>			
Зохиогч:			<a href="#">"Барилга байгууламж" ХХК</a>			
Гэрээний дүн, сая төгрөг			Анхны		705,300	
			Сүүлийн		705,300	
Эхлэх хугацаа:			2021-10-07			
Дуусах хугацаа:			2024-10-01			
Нийт санхүүжилт			2,628.5			

Одоогийн байдал /2024.01.10/



Үе шатны ажлуудын явц, хувь	
Газар шороо	100
Суурь	100
Төмөр бетон карказ	0
Хана, хамар ханын өрлөг	72
Шал	0
Хаалга, цонх	0
Дээвэр	84
Дотор засал	0
Гадна засал	90
Халаалт	100
Салхивч	90
Цэвэр, бохир ус	100
Дулааны уэль	100
Холбоо дохиолол	0
Дотор гэрэлтүүлэг	0
Хүчит төхөөрөмж	0
Гадна тохижилт	0
Гадна дулаан	100
Гадна ариутгах татуурга	100
Гадна ус хангамж	100
Гадна цахилгаан	100
Гадна холбоо	100
<b>БУА-ын гүйцэтгэл /дундаж/</b>	<b>73 %</b>

Бусад мэдээлэл, тайлбар /онцлох мэдээлэл оруулна/

Тэнхлэгээрээ 42,68м х 36,68м хэмжээтэй, зоорьгүй 2 давхар барилга байна.

Явцын зураг /2024.01.10/ /дотор/



Эскиз зураг

Одоогийн байдал /2024.01.10/

Хэрэгжиж эхэлсэн он	Дуусах он		Төсөвт өртөг		Санхүүжилт	
	Анх төлөвлөсөн	2023 оны ТТХ	Анх төлөвлөсөн	2023 оны ТТХ	2023 оны ТТХ	Авсан санхүүжилт 2023 он
2021	2021	2023	1,300.0	0	0	0

Захиалагч:	БТСУХ	
Гүйцэтгэгч:	<a href="#">БИ ЭМ ЖИ ЮУ ХХК</a>	
Зохиогч:	<a href="#">"Алтайн газрын хүч" ХХК</a>	
Гэрээний дүн, сая төгрөг	Анхны	1,300,000,000.0 0
	Сүүлийн	1,300,000,000.0 0
Эхлэх хугацаа:	2021-07-15	
Дуусах хугацаа:	2022-12-20	
Нийт санхүүжилт	1,024,8	



Үе шатны ажлуудын явц, хувь	
Газар шороо	100
Суурь	100
Төмөр бетон карказ	40
Хана, хамар ханын өрлөг	0
Шал	0
Хаалга, цонх	0
Дээвэр	0
Дотор засал	0
Гадна засал	0
Халаалт	0
Салхивч	0
Цэвэр, бохир ус	0
Дулааны узель	0
Холбоо дохиолол	0
Дотор гэрэлтүүлэг	0
Хүчит төхөөрөмж	0
Гадна тохижилт	0
Гадна дулаан	0
Гадна ариутгах татуурга	0
Гадна ус хангамж	0
Гадна цахилгаан	0
Гадна холбоо	0
<b>БУА-ын гүйцэтгэл /дундаж/</b>	<b>11 %</b>

Бусад мэдээлэл, тайлбар /онцлох мэдээлэл оруулна/

Спорт заал тэнхлэгээрээ 21.0 м х 36.0 м хэмжээтэй, туслах барилга тэнхлэгээрээ 21.0 м х 6.0 м хэмжээтэй, 2 давхар барилга байна.

Явцын зураг /2024.01.10/ /дотор/



28.ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ / Дүүргийн спорт цогцолбор барилга 1000 суудалтай, Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг /

Эскиз зураг

Хэрэгжиж эхэлсэн он	Дуусах он		Төсөвт өртөг		Санхүүжилт	
	Анх төлөвлөсөн	2023 оны ТТХ	Анх төлөвлөсөн	2023 оны ТТХ	2023 оны ТТХ	Авсан санхүүжилт 2023 он
2019						
	2019	2023	11.08 3.6	0	0	0
Захиалагч:			БТСУХ			
Гүйцэтгэгч:			<a href="#">"Атимос" ХХК</a>			
Зохиогч:			<a href="#">"ХТХЕИ" ХХК</a>			
Гэрээний дүн, сая төгрөг			Анхны	1,613,974,842.0 0		
			Сүүлийн	1,613,974,842.0 0		
Эхлэх хугацаа:			2019-12-17			
Дуусах хугацаа:			2023-12-25			
Нийт санхүүжилт			<b>1,703,371,133.00</b>			

Одоогийн байдал /2024.01.10/



Үе шатны ажлуудын явц, хувь	
Газар шороо	100
Суурь	100
Төмөр бетон карказ	100
Хана, хамар ханын өрлөг	100
Шал	50
Хаалга, цонх	100
Дээвэр	100
Дотор засал	60
Гадна засал	100
Халаалт	100
Салхивч	100
Цэвэр, бохир ус	100
Дулааны уzelь	0
Холбоо дохиолол	100
Дотор гэрэлтүүлэг	100
Хүчит төхөөрөмж	100
Гадна тохижилт	50
Гадна дулаан	50
Гадна ариутгах татуурга	100
Гадна ус хангамж	0
Гадна цахилгаан	100
Гадна холбоо	0
<b>БУА-ын гүйцэтгэл /дундаж/</b>	<b>70 %</b>

Бусад мэдээлэл, тайлбар /онцлох мэдээлэл оруулна/

Тэнхлэгээрээ 44.0м х 24.0м хэмжээтэй, зoorьгүй 2 давхар барилга байна.

Явцын зураг /2024.01.10/ /дотор/





Эскиз зураг

Хэрэгжиж эхэлсэн он	Дуусах он		Төсөвт өртөг		Санхүүжилт	
	Анх төлөвлөсөн	2023 оны ТТХ	Анх төлөвлөсөн	2023 оны ТТХ	2023 оны ТТХ	Авсан санхүүжилт 2023 он
2022						
	2022	2024	662.0	0	0	0
Захиалагч:			БТСУХ			
Гүйцэтгэгч:			<a href="#">Хүрийн овоо ХХК</a>			
Зохиогч:			<a href="#">Нью-Товер ХХК</a>			
Гэрээний дүн, сая төгрөг			Анхны	705,300		
			Сүүлийн	705,300		
Эхлэх хугацаа:			2022-06-22			
Дуусах хугацаа:			2022-12-31			
Нийт санхүүжилт			661,867,056.00			

Одоогийн байдал /2024.01.10/



Үе шатны ажлуудын явц, хувь

Газар шороо	100
Суурь	100
Төмөр бетон карказ	100
Хана, хамар ханын өрлөг	100
Шал	100
Хаалга, цонх	100
Дээвэр	100
Дотор засал	100
Гадна засал	100
Халаалт	100
Салхивч	100
Цэвэр, бохир ус	100
Дулааны уzelь	100
Холбоо дохиолол	100
Дотор гэрэлтүүлэг	100
Хүчит төхөөрөмж	100
Гадна тохижилт	100
Гадна дулаан	100
Гадна ариутгах татуурга	100
Гадна ус хангамж	100
Гадна цахилгаан	100
Гадна холбоо	100
<b>БУА-ын гүйцэтгэл /дундаж/</b>	<b>100 %</b>

Бусад мэдээлэл, тайлбар /онцлох мэдээлэл оруулна/

Барилгын нийт талбай 30\*15м хэмжээтэй, 10\*6м хүзүүвчтэй. 510м2 байна.

Явцын зураг /2024.01.10/ /дотор/





Эскиз зураг



Хэрэгжиж эхэлсэн он	Дуусах он		Төсөвт өртөг		Санхүүжилт	
	Анх төлөвлөсөн	2023 оны ТТХ	Анх төлөвлөсөн	2023 оны ТТХ	2023 оны ТТХ	Авсаг санхүүжилт 2023
2020						
	2022	2025	27,116,000	0	0	1,500

Захиалагч:	БТСУХ	
Гүйцэтгэгч:	"Нэмбар" ХХК	
Зохиогч:	"Идеал групп" ХХК	
Гэрээний дүн, сая төгрөг	Анхны	10,000.00
	Сүүлийн	15,000.00
Эхлэх хугацаа:	2011.11.11	
Дуусах хугацаа:	2022.11.11	
Нийт санхүүжилт	27,116,0	

Одоогийн байдал /2024.02.20/



Үе шатны ажлуудын явц, хувь	
Газар шороо	100
Суурь	100
Төмөр бетон карказ	100
Хана, хамар ханын өрлөг	100
Шал	100
Хаалга, цонх	80
Дээвэр	100
Дотор засал	30
Гадна засал	90
Халаалт	100
Салхивч	90
Цэвэр, бохир ус	100
Дулааны узель	100
Холбоо дохиолол	80
Дотор гэрэлтүүлэг	100
Хүчит төхөөрөмж	90
Гадна тохижилт	90
Гадна дулаан	100
Гадна ариутгах татуурга	100
Гадна ус хангамж	100
Гадна цахилгаан	100
Гадна холбоо	100
<b>БУА-ын гүйцэтгэл /дундаж/</b>	<b>80</b>

Бусад мэдээлэл, тайлбар /онцлох мэдээлэл оруулна/

"А" блок: Тэнхлэгээрээ 49.0м х 42.0 м хэмжээтэй, зорь бүхий 2 давхар, 2200 хүний суудалтай спортын заалны зориулалттай, "В" блок: Тэнхлэгээрээ 21.0м х 42.0м хэмжээтэй, зорь бүхий 3 давхар, 140 хүний суудалтай 5 замтай усан бассейн, бэлтгэлийн заалны зориулалттай, "С" блок: Тэнхлэгээрээ 16.0м х 18.0м хэмжээтэй, зорь бүхий 10 давхар оффисын зориулалттай, "Д" блок: Тэнхлэгээрээ 54.0м х 15.0м хэмжээтэй, зорь бүхий 3 давхар, ресторан, кафе, оффисын зориулалттай, "Е" блок: Тэнхлэгээрээ 14.0м х 18.0м хэмжээтэй, зорь бүхий 2 давхар ресторан, хурлын заал, оффисын зориулалттай барилга байна.

Явцын зураг /2024.01.10/ /дотор/

